Commune d'Anières

CHEVRENS
ROUTE DE CHEVRENS
MISE EN ZONE 30 km/h - Aménagements

PLAN DE DEVIATION
Transports Individuels

N° de plan :
21-36-132

EXECUTION

Indice	Modification	Date	Dess.
A	Pose de balisages mise en sens unique	14.04.2023	DSD
B	Marquage et mise en place de STOP	20.05.2023	DSD
C			
D			
E			
F			
G			
H			
I			
J			

Echelle :
Contrôleur :
Date : 30.03.2023
Dessin : DSD
Contrôle : AL

N° de dif. :
Format :

BAIEC
BAIEC Direction de Travaux SA
Ch. du Pré-Fleuri 3 - Case postale 1754 - 1228 Plan-les-Ouates
Tél. +41 (0)22 884 78 00 - Fax +41 (0)22 884 78 01
www.groupebaiec.ch - info@groupebaiec.ch

LEGENDE :

- DEVIATION — Panneau de déviation
- Trajet principal Transports Individuels (dir. Hermance)
- Trajet secondaire Transports Individuels (dir. Hermance)
- Trajet principal Transports Individuels (dir. Collonge-Bellerive)
- Trajet secondaire Transports Individuels (dir. Collonge-Bellerive)

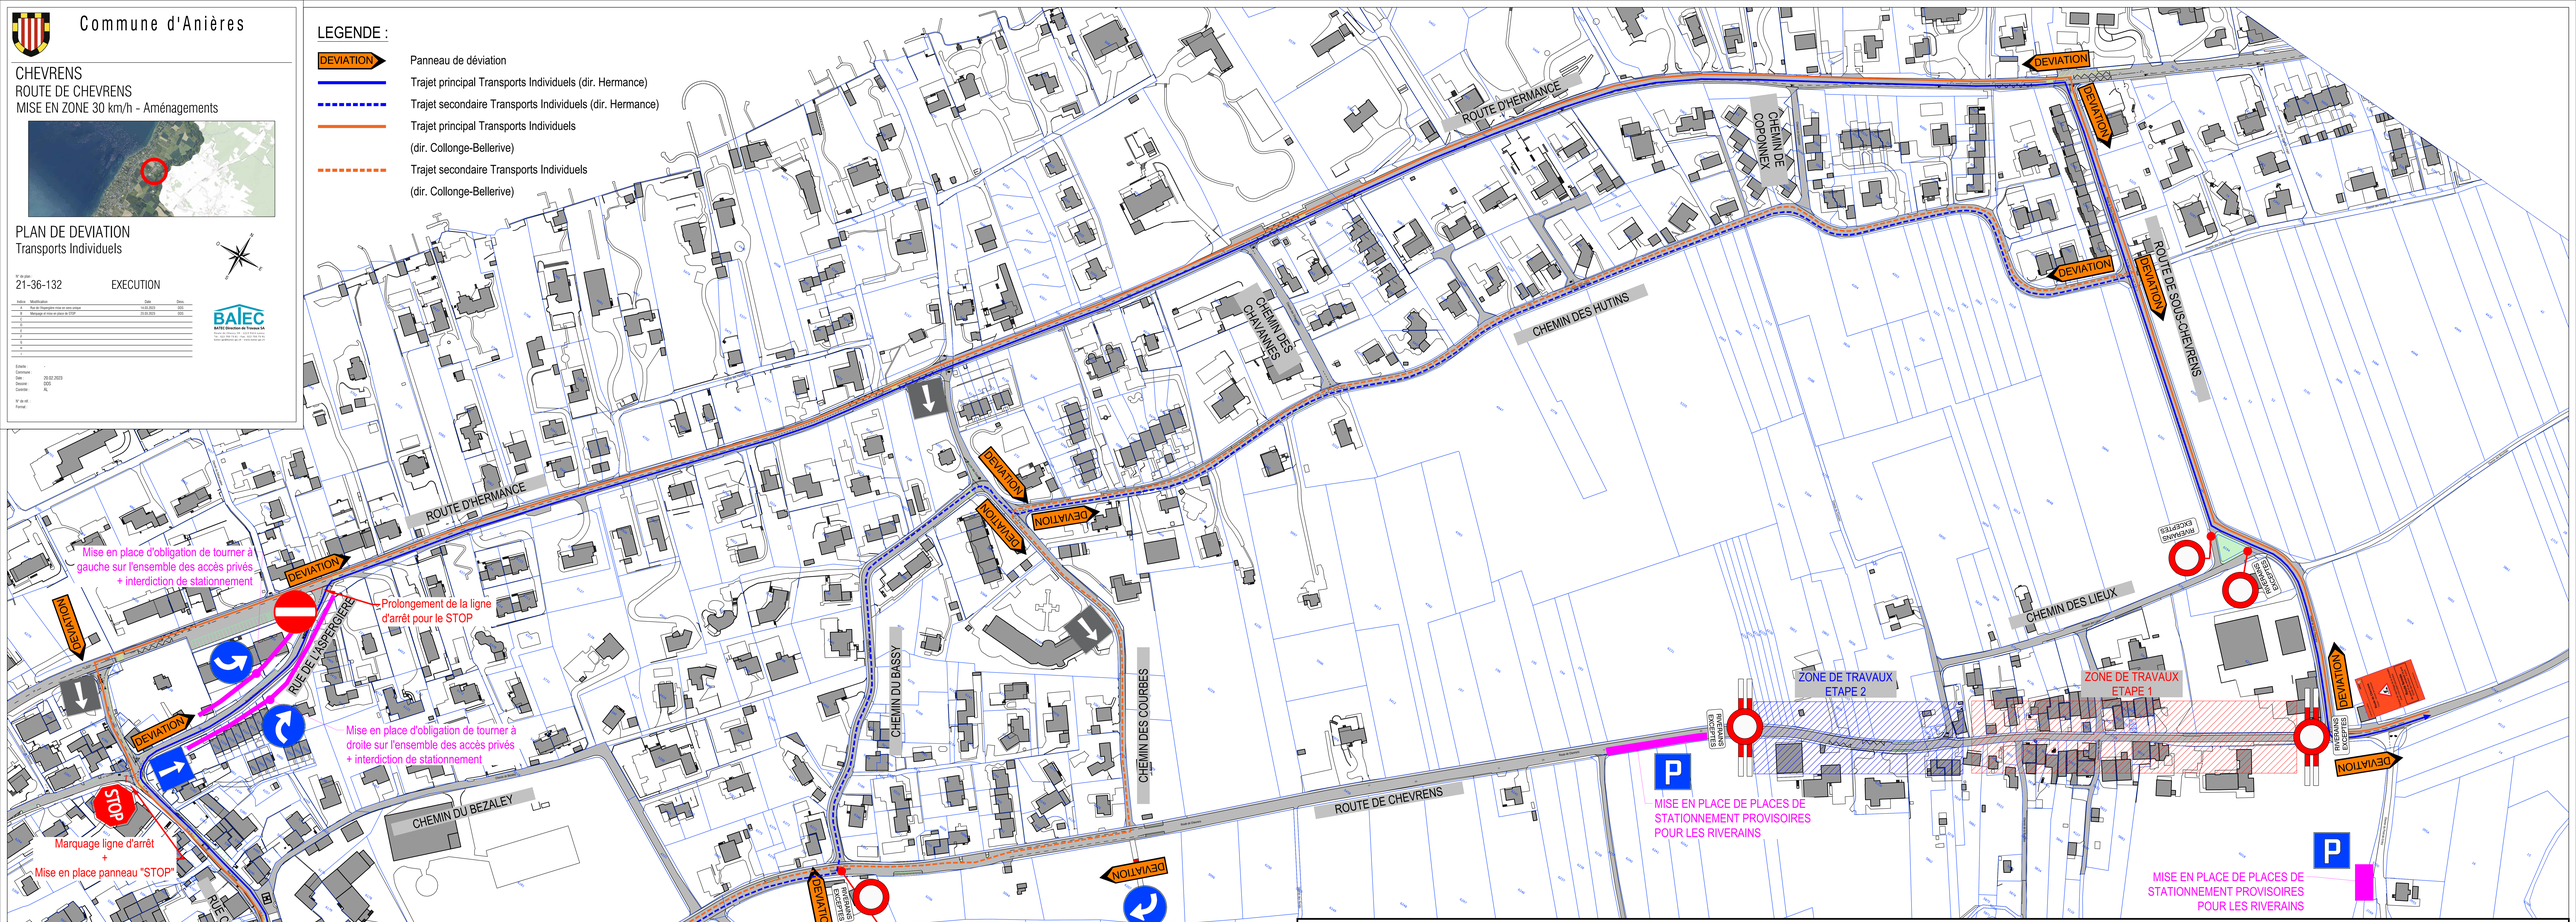

PLANNING :

MERCREDI, LE 12 AVRIL 2023 (7h30 - 18h00)

ROUTE FERMÉE ACCÈS RIVERAINS LIMITÉS*

VALABLE POUR L'ETAPE 1 & 2

- Travaux préparatoires
- Travaux de rabotage sur la route de Chevrens

JEUDI, LE 13 AVRIL 2023 (7h30 - 19h30)

ROUTE FERMÉE ACCÈS RIVERAINS LIMITÉS*

VALABLE POUR L'ETAPE 1 & 2

- Mise en oeuvre des enrobés bitumineux pour la réalisation de la couche de support

VENDREDI, LE 14 AVRIL 2023 (7h30 - 17h30)

ROUTE FERMÉE ACCÈS RIVERAINS LIMITÉS*

VALABLE POUR L'ETAPE 1 & 2

- Mise en oeuvre des enrobés bitumineux pour la réalisation de la couche de finition
- Etape 1 - 7h30 à 12h30
- Etape 2 - 12h30 à 17h30
- **Ouverture de la route de Chevrens aux bus TPG, LE SAMEDI 15 AVRIL À 5H00**

*) À CONVENIR AVEC CONTREMAÎTRE / RESPONSABLE DE CHANTIER
